
Bodensanierung Bau 7.1 - Normallager





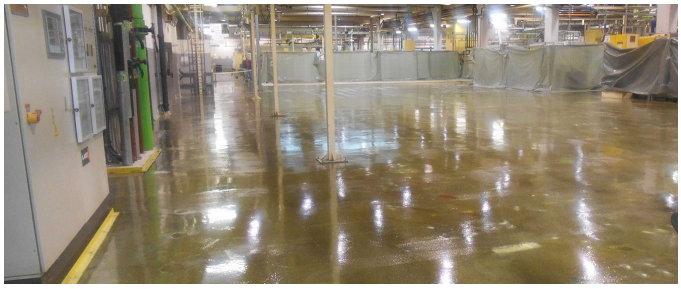

ZUSAMMENFASSUNG

Die Implenia Tesch GmbH saniert den Industrieboden in Bau 7.1 der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Wuppertal.

DAS PROJEKT

Anfang Dezember 2015 erhielt die Implenia Tesch GmbH den Auftrag zur Sanierung des Industriebodens im Bau 7.1 der Schaeffler AG & Co. KG in Wuppertal.

Art und Umfang der Arbeiten:

- Zuerst wurde der Arbeitsbereich mit Bauzäunen und Staubschutzfolie gesichert sowie die Fläche freigeräumt.
- Anschließend wurden die Stahlbauteile angepasst und die vorhandenen Öffnungen brandschutztechnisch verschlossen.
- Zur Vorbereitung der eigentlichen Beschichtungsarbeiten wurde die Fläche gestrahlt, gereinigt sowie entölt. Vorhandene Risse wurden vernadelt.
- Nach Aufbringen einer Kratzspachtelung wurde eine widerstandsfähige Industriebodenbeschichtung einschl.

Kopfversiegelung aufgebracht.

- Alle oben beschriebenen Arbeiten wurden innerhalb von 14 Tagen bei teilweise laufendem Betrieb durchgeführt.

FACTS

Standort	Mettmanner Straße 79, Wuppertal , Deutschland
Status	fertiggestellt
Bauvolumen (Wert unserer Leistungen)	125.000 EUR
Baubeginn	Dezember 2015
Fertigstellung	Dezember 2015
Auftraggeber	Schaeffler Technologies AG & Co. KG

LEISTUNGEN

Tesch

Industriebau
